



Ebook Free _____

Các quy trình trong doanh nghiệp Xây dựng

(Tài liệu dành cho CEO, BQL dự án, Nhà thầu, Chủ đầu tư)

MỤC LỤC:

Phần 1: Tổng hợp quy trình xây dựng	03
Quy trình 1: Quy trình thi công xây dựng	04
Quy trình 2: Quy trình kiểm soát thi công	06
Quy trình 3: Quy trình quản lý vật tư công trình	08
Quy trình 4: Quy trình đặt mua và thanh toán vật tư	11
Quy trình 5: Quy trình xem xét hợp đồng xây dựng	15
Quy trình 6: Quy trình thuê thầu phụ	18
Quy trình 7: Quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ	20
 Phần 2: Hướng dẫn số hóa quy trình	 23
Số hóa dự án, lập kế hoạch thi công	24
Số hóa quy trình báo cáo thi công ở công trường	25
Số hóa quy trình đề xuất – duyệt mua vật tư	27
Số hóa quy trình cung ứng, xuất nhập vật tư	28
Số hóa quy trình đề xuất thanh toán chi phí & thanh toán cho thầu phụ/NCC	29
 Phần 3: Giới thiệu giải pháp quản lý dự án thi công xây dựng FastCons	 30




Phần 1: TỔNG HỢP 7 QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

Kèm sơ đồ mẫu

Quy trình 1: Quy trình thi công xây dựng

Sơ đồ quy trình thi công Ngành xây dựng

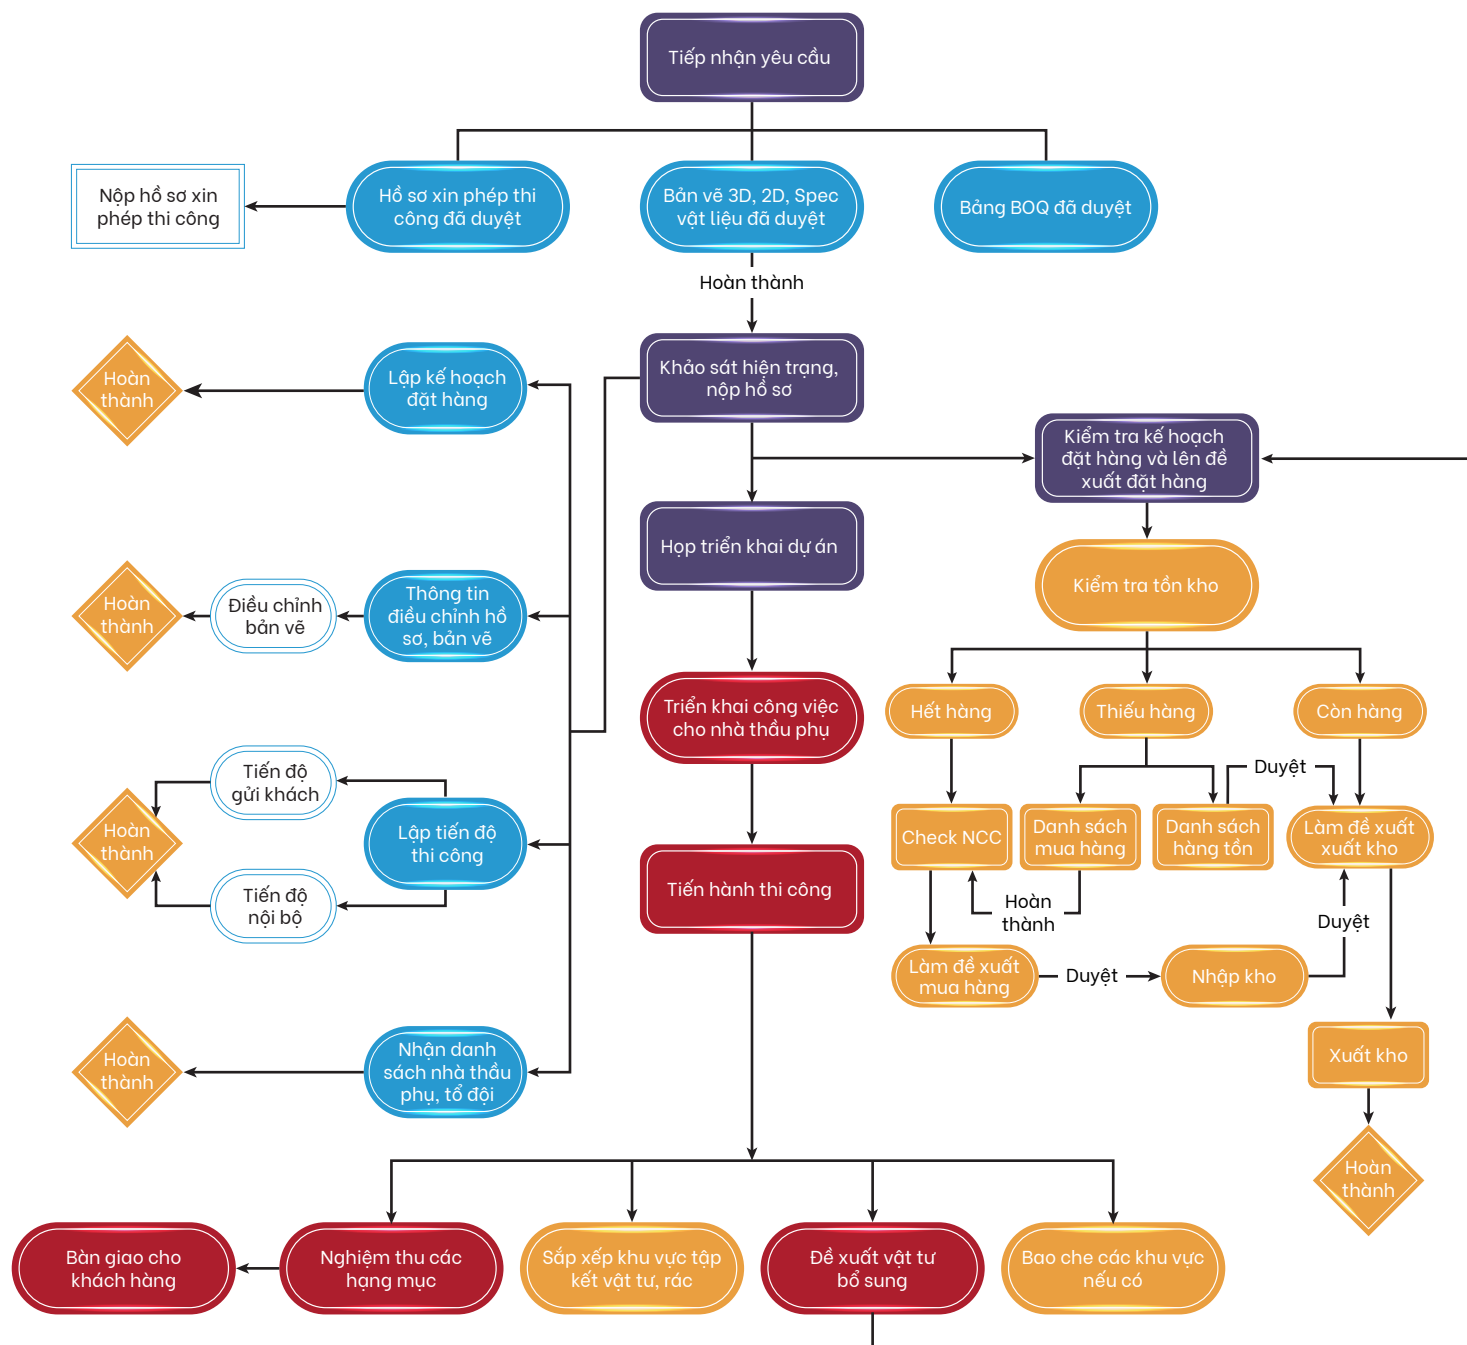

Mục đích sử dụng:

Quy trình thi công xây dựng bao quát toàn bộ các giai đoạn và các bước thực hiện để tổ chức một dự án xây dựng, phối kết hợp giữa Ban giám đốc, ban Quản lý dự án/ Chỉ huy trưởng, Kỹ sư, Kế toán, Cán bộ kho công trình.

Các giai đoạn trong Quy trình thi công xây dựng:

Quy trình thi công gồm 3 giai đoạn chính: trước - trong và sau thi công. Trong đó giai đoạn trước thi công được chia làm 4 giai đoạn nhỏ:

1. Tiếp nhận yêu cầu (tiếp nhận hồ sơ thi công, bản vẽ & bảng BoQ đã duyệt)
2. Khảo sát hiện trạng, nộp hồ sơ thi công: Giai đoạn này yêu cầu nhà thầu chính phải lên kế hoạch đặt hàng, chốt lại bản vẽ công trình, lập kế hoạch tiến độ thi công & nhận danh sách nhà thầu phụ, tổ đội
3. Kiểm tra kế hoạch đặt hàng và lên kế hoạch mua hàng
4. Chốt hợp triển khai dự án


Giai đoạn tổ chức thi công quy định các vấn đề về kiểm soát khối lượng, điều phối vật tư & quy trình báo cáo/ nghiệm thu thi công & bàn giao công trình.

Bảng mô tả quy trình thi công xây dựng

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Tiếp nhận yêu cầu	Phòng Thi công	Nắm bắt đầy đủ thông tin yêu cầu, ngân sách, thời gian bàn giao của chủ đầu tư để chuẩn bị kế hoạch thi công, phân bổ thời gian & nguồn lực hợp lý. - Bản vẽ 2D, 3D, Spec vật liệu đã duyệt - Bảng BoQ đã duyệt - Hồ sơ xin phép thi công đã duyệt
Khảo sát hiện trạng, nộp hồ sơ xin phép thi công	Phòng Thi công	- Lập kế hoạch đặt hàng - Thông tin điều chỉnh hồ sơ, bản vẽ - Lập tiến độ thi công - Nhận danh sách nhà thầu phụ, tổ đội
Họp triển khai dự án	- Phòng Thi công - Phòng Vật tư - HCNS - TCKT - Bộ phận công trường - Bộ phận kiểm tra chất lượng (KCS)	Thống nhất kế hoạch công việc, vai trò và trách nhiệm của từng phòng ban.
Kiểm tra kế hoạch đặt hàng và lên đề xuất đặt hàng	- Phòng Vật tư - TCKT	Kiểm tra tồn kho - Nếu còn hàng thì làm đề xuất xuất kho, được duyệt thì xuất hàng - Nếu thiếu hàng, lập danh sách hàng tồn xong làm đề xuất xuất kho. Hoặc lập danh sách mua hàng, check NCC, làm đề xuất mua hàng, nhập kho sau đó làm đề xuất xuất kho. - Nếu hết hàng thì check NCC rồi thực hiện các bước như ở trường hợp thiếu hàng.
Triển khai công việc cho nhà thầu phụ	- Phòng Thi công - Công trường	Lên kế hoạch công việc chi tiết cho nhà thầu phụ
Tiến hành thi công	- Phòng Thi công - Công trường	- Bao che các khu vực (nếu có) - Sắp xếp khu vực tập kết vật tư, rác - Đề xuất vật tư bổ sung - Nghiệm thu các hạng mục
Hoàn thành	Ban quản lý	Bàn giao cho khách hàng

Quy trình 2: Quy trình kiểm soát thi công

Sơ đồ Quy trình kiểm soát thi công ngành Xây dựng

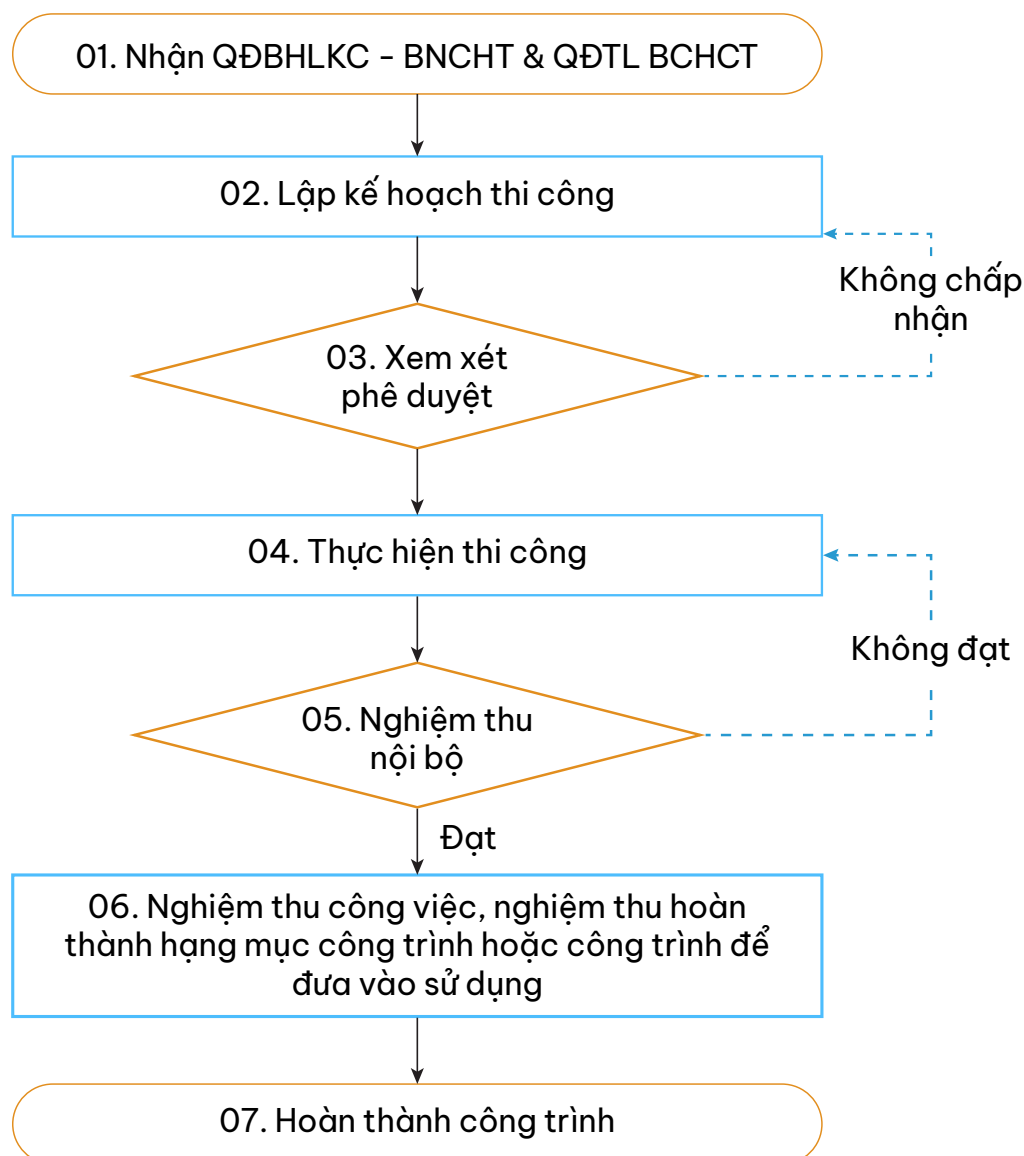

Mục đích sử dụng:

Quy trình này được thiết lập nhằm quản lý, theo dõi tiến độ thi công các hạng mục đảm bảo đạt tiến độ chung của công trình, bàn giao đúng hạn cho chủ đầu tư. Là quy trình tiêu chuẩn phù hợp với các doanh nghiệp Xây dựng vừa & lớn, chuyên thi công những dự án quy mô lớn.

Các giai đoạn trong quy trình Kiểm soát thi công ngành Xây dựng:

Quy trình kiểm soát thi công ngành Xây dựng về cơ bản được chia thành 3 giai đoạn chính, bao gồm:


1. Lập kế hoạch thi công (nhận quyết định Ban hành lệnh khởi công và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng (QĐBHLKC – BNCHT), nhận quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình (QĐTLBCHCT) sau đó lên kế hoạch thi công)
2. Thực hiện thi công: Xem xét, phê duyệt kế hoạch thi công, sau đó chuyển qua triển khai thực hiện.
3. Nghiệm thu bao gồm nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoặc công trình để đưa vào sử dụng để hoàn tất công trình, bàn giao cho CĐT

Bảng mô tả quy trình kiểm soát thi công ngành Xây dựng

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Nhận quyết định thi công	- Ban trợ lý - Chỉ huy trưởng - Giám sát nội bộ - Phó tổng giám đốc kỹ thuật	- Nhận quyết định Ban hành lệnh khởi công và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng (QĐBHLKC - BNCHT) - Nhận quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình (QĐTLBCHCT)
Lập kế hoạch thi công	- Ban trợ lý - Ban chỉ huy - Giám sát nội bộ	- Thiết lập quy trình thuê thầu phụ - Quy trình xem xét hợp đồng xây dựng - Mẫu nhật ký công trình - Mẫu báo cáo công việc tuần/ tháng
Xem xét, phê duyệt	- Giám sát nội bộ - Ban chỉ huy - Phó tổng giám đốc kỹ thuật	Các bộ phận phòng ban chịu trách nhiệm cân nhắc, đánh giá kế hoạch thi công. - Nếu đạt chuyển qua giai đoạn thực hiện thi công - Nếu không đạt yêu cầu lập lại kế hoạch thi công
Thực hiện thi công	- Ban chỉ huy - Giám sát nội bộ - Đội trưởng dự án	
Nghiệm thu nội bộ	- Cán bộ kỹ thuật - Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy - Giám sát nội bộ	Lập biên bản nghiệm thu nội bộ - Nếu đạt chuyển qua bước nghiệm thu từng công việc, hạng mục hoặc công trình đưa vào sử dụng - Nếu không đạt yêu cầu thi công lại
Nghiệm thu công việc, hạng mục hoặc công trình để đưa vào sử dụng	Ban chỉ huy	- Phê duyệt phiếu yêu cầu nghiệm thu - Lập biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình – giai đoạn thi công - Lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
Hoàn thành công trình	- Ban chỉ huy - Giám sát nội bộ - Ban trợ lý - Đội trưởng dự án - Phòng kỹ thuật – thi công	- Kiểm tra bản vẽ hoàn công - Kiểm tra hồ sơ chất lượng - Kiểm tra bảng quyết toán khối

Quy trình 3: Quy trình quản lý vật tư công trình

Sơ đồ quy trình quản lý vật tư tại công trình, phù hợp với các dự án lớn

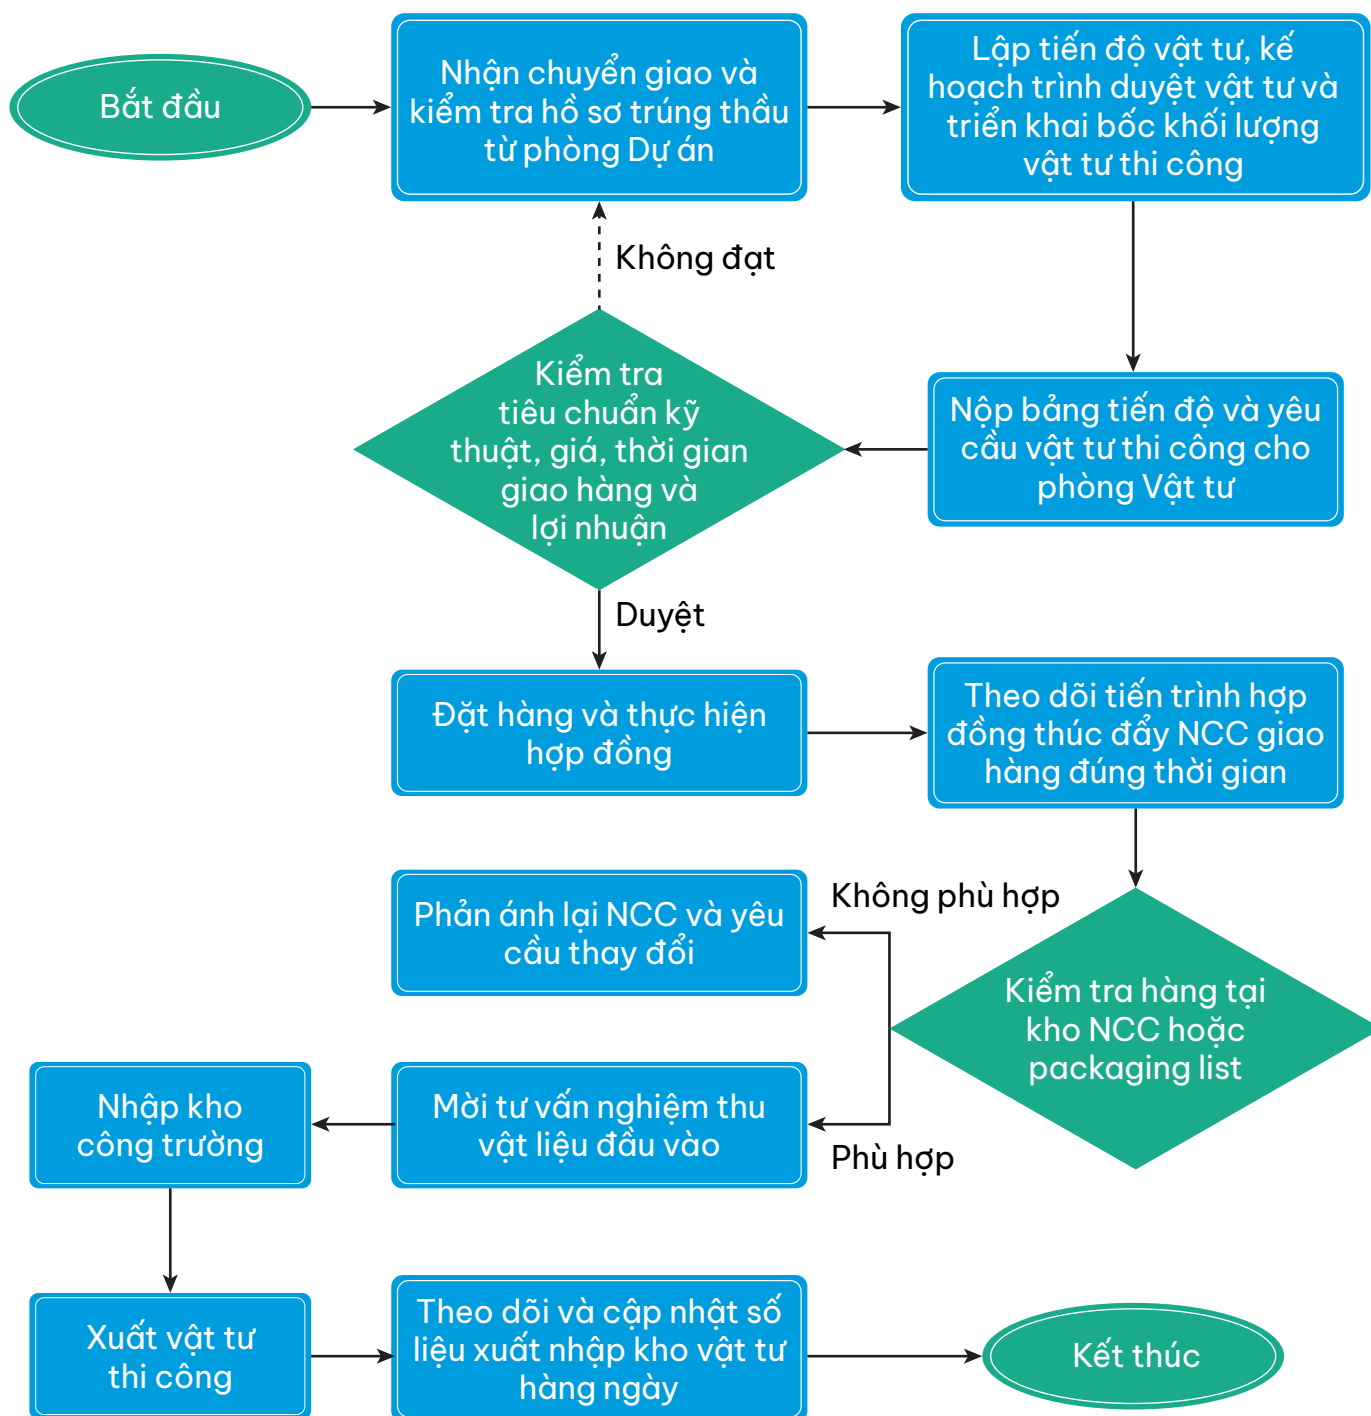

Mục đích sử dụng:

Quy trình này được thiết lập nhằm quản lý, theo dõi quá trình bốc vật tư, mua hàng, giao nhận và sử dụng vật tư đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của công trình.

Các giai đoạn trong quy trình theo dõi & kiểm soát vật tư thi công

Mẫu quy trình theo dõi & kiểm soát vật tư thi công FastWork chia sẻ được thiết kế phù hợp với những dự án xây dựng quy mô lớn, chia thành 5 giai đoạn chính:

1. Nhận chuyển giao & kiểm tra lại hồ sơ trúng thầu từ phòng dự án
2. Lập kế hoạch tiến độ vật tư: Sau khi lên kế hoạch chi tiết về khối lượng & tiến độ sử dụng vật tư, cần chuyển qua P.Vật tư & BLĐ phê duyệt, ban kiểm tra check tiêu chuẩn kỹ thuật, giá, thời gian giao hàng và lợi nhuận
3. Đặt hàng và thực hiện hợp đồng: Sau khi đặt hàng, theo dõi sát sao tiến trình hợp đồng thúc đẩy NCC giao hàng đúng thời hạn, nghiệm thu.
4. Nhập kho công trường
5. Xuất vật tư thi công

Bảng mô tả quy trình theo dõi & kiểm soát vật tư thi công

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Nhận chuyển giao và kiểm tra lại hồ sơ trúng thầu từ phòng dự án	- Phòng Dự án - Quản lý dự án	- Tiếp nhận chuyển giao hồ sơ - Kiểm tra hồ sơ trước khi lập kế hoạch sử dụng vật tư.
Lập tiến độ vật tư, kế hoạch trình duyệt vật tư và triển khai bốc khối lượng vật tư thi công	- Chỉ huy trưởng - Kỹ sư công trường	- Lên kế hoạch chi tiết về khối lượng & tiến độ vật tư sử dụng - Bốc khối lượng vật tư thi công
Nộp bảng tiến độ và yêu cầu vật tư thi công cho phòng Vật tư	- Thư ký công trường - Kỹ sư công trường	Trình duyệt kế hoạch cho phòng Vật tư và BLĐ
Kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, giá, thời gian giao hàng và lợi nhuận	- Ban kiểm tra - Quản lý dự án/ Chỉ huy trưởng - Phòng Vật tư	- Check không đạt chuyển lại bước nhận chuyển giao và kiểm tra lại hồ sơ trúng thầu từ phòng Dự án - Nếu đạt chuyển tiếp sang giai đoạn đặt hàng
Đặt hàng và thực hiện hợp đồng	- Quản lý dự án - Phòng Vật tư	Tiến hành đặt hàng đảm bảo đủ số lượng yêu cầu theo kế hoạch
Theo dõi tiến trình hợp đồng thúc đẩy NCC giao hàng đúng thời hạn	- Quản lý dự án - Phòng Vật tư	Thúc giục NCC, đảm bảo tiến độ giao hàng

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Kiểm tra hàng tại kho NCC hoặc packing list	- Kỹ sư công trường - Thủ kho	- Kiểm tra hàng nếu không phù hợp phản ánh lại nhà cung cấp, yêu cầu thay đổi sau đó mời tư vấn nghiệm thu vật liệu đầu vào. - Nếu kiểm tra hàng phù hợp, có thể mời tư vấn nghiệm thu luôn
Mời tư vấn nghiệm thu vật liệu đầu vào	- Tư vấn - Chỉ huy trưởng - Thủ kho	Đưa ra những đánh giá khách quan đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào đáp ứng nhu cầu thi công.
Nhập kho công trường	- Kỹ sư công trường - Thủ kho	Thực hiện nhập kho hàng
Xuất vật tư thi công	- Chỉ huy trưởng - Kỹ sư công trường - Cán bộ kiểm tra - Thủ kho	Xuất vật tư theo từng giai đoạn như kế hoạch đã đề ra
Theo dõi và cập nhật số liệu xuất nhập kho vật tư hàng ngày	- Kỹ sư công trường - Cán bộ kiểm tra - Thủ kho	Liên tục cập nhật tình hình vật tư theo thời gian thực, đảm bảo nguồn cung vật tư đáp ứng đủ xuyên suốt quá trình thi công.




Quy trình 4: Quy trình đặt mua và thanh toán vật tư

Mục đích sử dụng:

Quy trình này giúp các bộ phận Quản lý dự án, cán bộ công trường, cán bộ vật tư, kế toán biết rõ các công việc cần làm để triển khai việc đặt mua và thanh toán vật tư hiệu quả, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiến độ của công trình.

4.1. Quy trình đặt mua vật tư

Sơ đồ quy trình đặt mua vật tư:

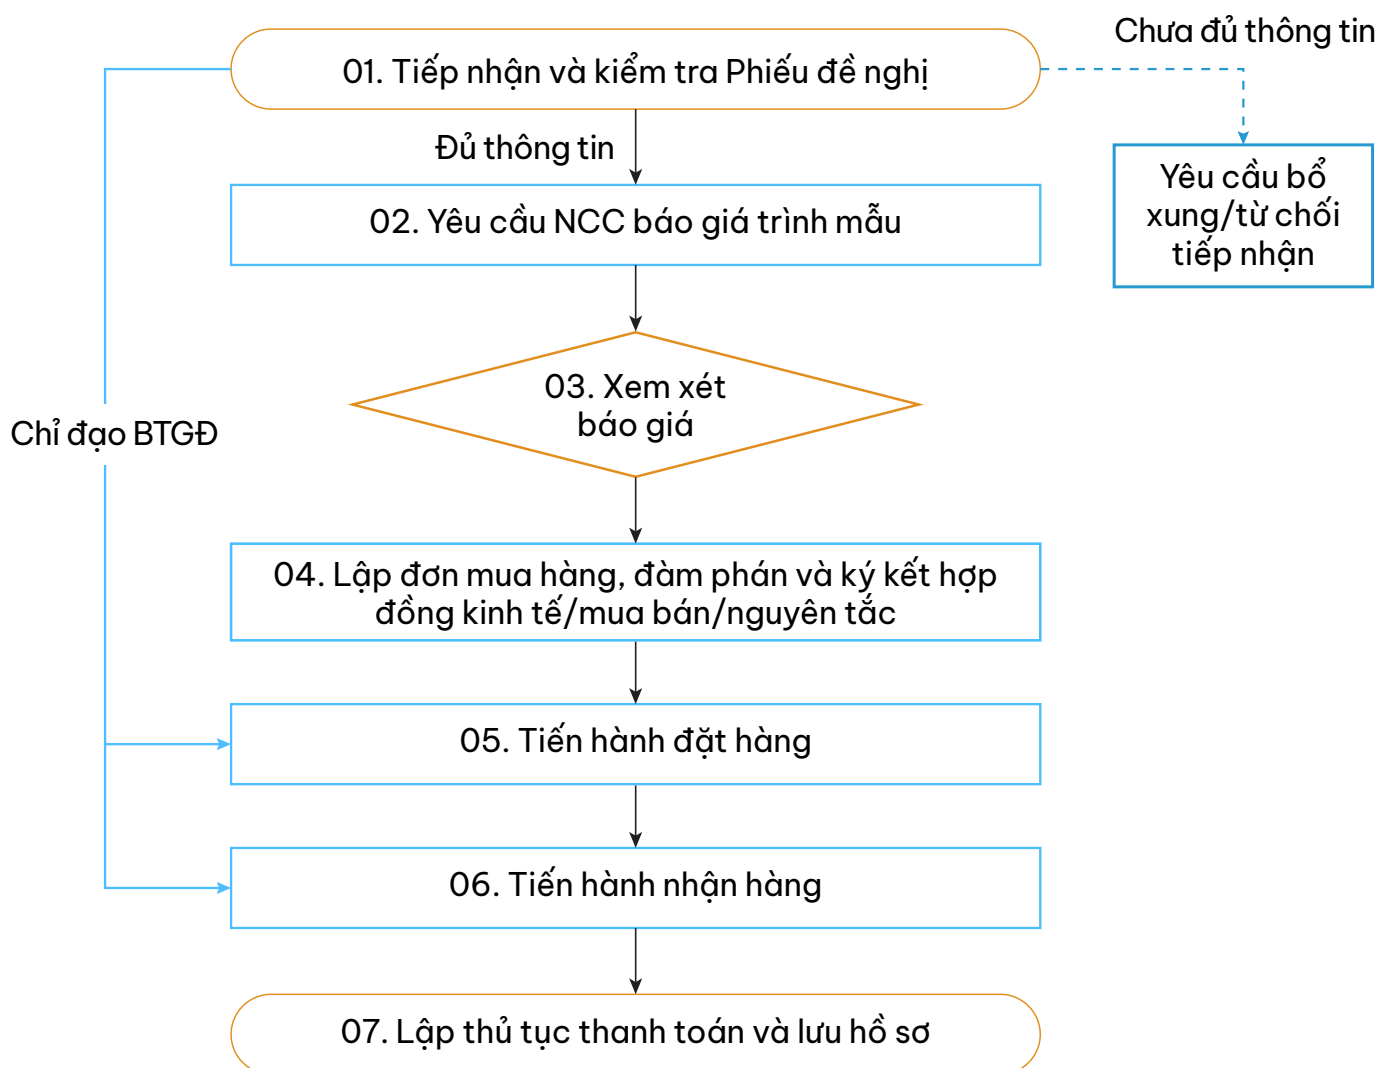

Các giai đoạn trong quy trình đặt mua vật tư:


- Tiếp nhận và kiểm tra phiếu đề nghị
- Yêu cầu NCC báo giá trình mẫu
- Xét duyệt báo giá
- Lập đơn mua hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế/ mua bán/ nguyên tắc
- Tiến hành đặt hàng
- Tiến hành nhận hàng
- Lập thủ tục thanh toán và Lưu hồ sơ

Bảng mô tả chi tiết Quy trình đặt mua vật tư

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Tiếp nhận và kiểm tra phiếu đề nghị	- Nhân viên cung ứng - Thủ kho Tổng - Quản lý cung ứng - Quản lý kho - Giám sát nội bộ	Trưởng phòng/ quản lý các phòng ban tiếp nhận đề xuất vật tư và tiến hành kiểm tra nhu cầu mua vật tư của phòng thi công - Nếu phiếu đề xuất phù hợp, liên hệ nhà cung cấp để lấy báo giá - Nếu phiếu đề xuất chưa đủ thông tin thì gửi yêu cầu bổ sung cho phòng thi công, hoặc từ chối tiếp nhận
Yêu cầu NCC báo giá trình mẫu	- Quản lý cung ứng - Nhân viên cung ứng	- Nhận phiếu đề xuất vật tư & Lập danh sách NCC - Gửi yêu cầu NCC báo giá và tổng hợp thành bảng trình duyệt
Xét duyệt báo giá	- Quản lý cung ứng - Nhân viên cung ứng	Tiến hành xét duyệt/ lựa chọn NCC phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, giá thành hợp dự toán
Lập đơn mua hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế/ mua bán/ nguyên tắc	- Quản lý cung ứng - Nhân viên cung ứng - Phó tổng Giám đốc kinh doanh	Lập đơn mua hàng và liên hệ với NCC được duyệt để đàm phán, ký kết hợp đồng
Tiến hành đặt hàng	- Quản lý cung ứng - Quản lý kho - Thủ kho Tổng - Thủ kho công trình	Phòng vật tư tiến hành đặt hàng theo nội dung đã ký trong hợp đồng với NCC
Tiến hành nhận hàng	- Nhân viên cung ứng - Thủ kho công trình - Thủ kho Tổng - Cán bộ kỹ thuật	- Kiểm tra chất lượng, khối lượng hàng hóa bên NCC gửi, và tiến hành nhập kho theo quy trình - Lập các chứng từ giao nhận hàng hóa và phiếu theo dõi NCC
Lập thủ tục thanh toán và Lưu hồ sơ	- Quản lý cung ứng - Nhân viên cung ứng - Phòng kỹ thuật - thi công	- Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng NCC để làm phiếu thanh toán - Chuyển hồ sơ NCC sang bộ phận lưu trữ theo quy định sau khi hoàn tất thanh toán và kết thúc hợp đồng

4.2. Quy trình thanh toán vật tư

Sơ đồ quy trình thanh toán vật tư:

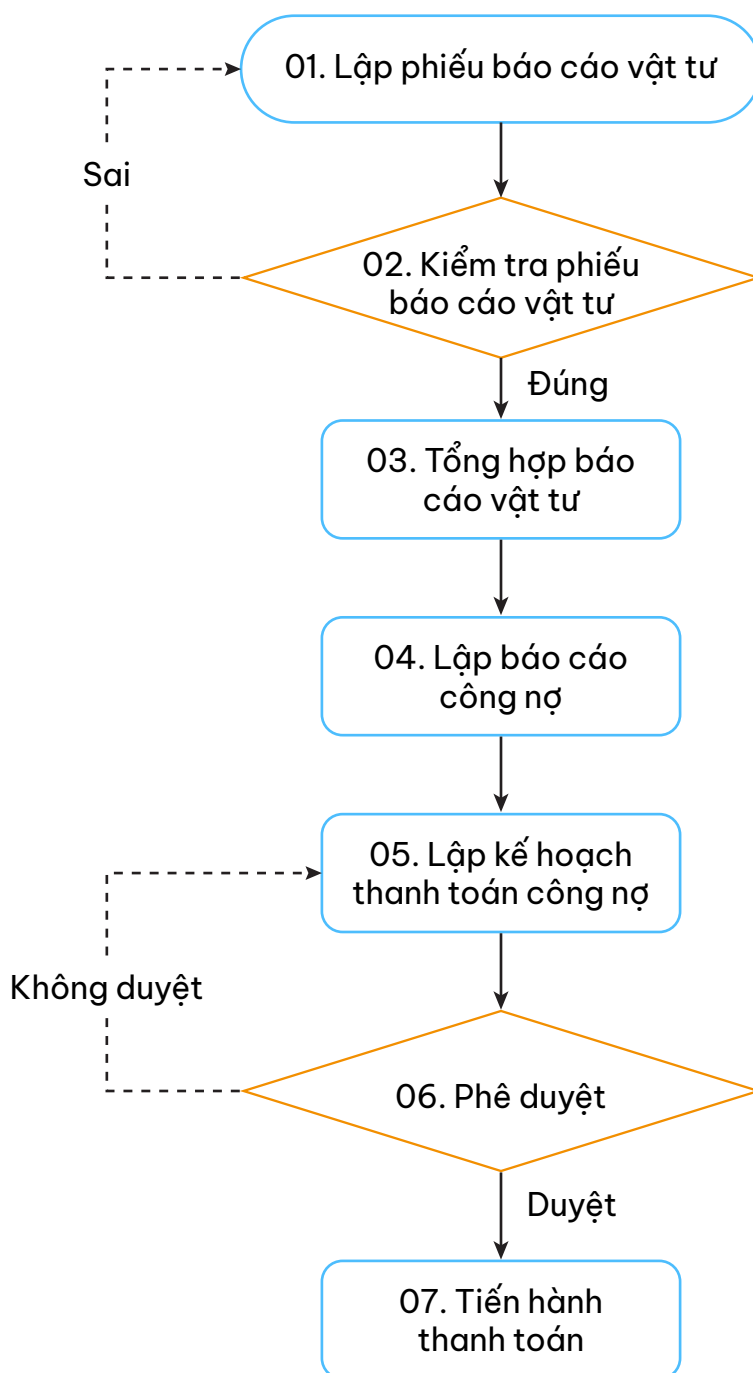

Các giai đoạn trong quy trình thanh toán vật tư:

- Lập phiếu báo cáo vật tư
- Kiểm tra phiếu báo cáo vật tư
- Tổng hợp báo cáo vật tư
- Lập báo cáo công nợ
- Lập kế hoạch thanh toán công nợ
- Phê duyệt kế hoạch thanh toán công nợ
- Tiến hành thanh toán


Bảng mô tả chi tiết Quy trình thanh toán vật tư

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Lập phiếu báo cáo vật tư	Cán bộ công trường	Bộ phận công trình lập các phiếu báo cáo vật tư định kỳ từ NCC, và gửi về phòng vật tư
Kiểm tra	Phòng vật tư	Tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác của các phiếu báo cáo vật tư
Tổng hợp báo cáo vật tư	Phòng vật tư	Tổng hợp thành file báo cáo vật tư và gửi cho phòng kế toán
Lập báo cáo công nợ	Phòng kế toán	Tiến hành lập báo cáo công nợ và đối soát qua các hoá đơn, chứng từ liên quan
Lập kế hoạch thanh toán công nợ	Phòng kế toán	Lập kế hoạch thanh toán công nợ, tạm ứng đặt hàng dựa trên các yếu tố nội tại và hạn thanh toán
Phê duyệt	Ban Giám đốc	Xem xét các báo cáo công nợ và kế hoạch thanh toán, sau đó tiến hành phê duyệt
Tiến hành thanh toán	Phòng kế toán	Tiến hành thanh toán cho NCC, đồng thời báo thông tin cho phòng vật tư và bộ phận công trường.



Quy trình 5: Quy trình xem xét hợp đồng xây dựng

Sơ đồ quy trình xem xét hợp đồng xây dựng

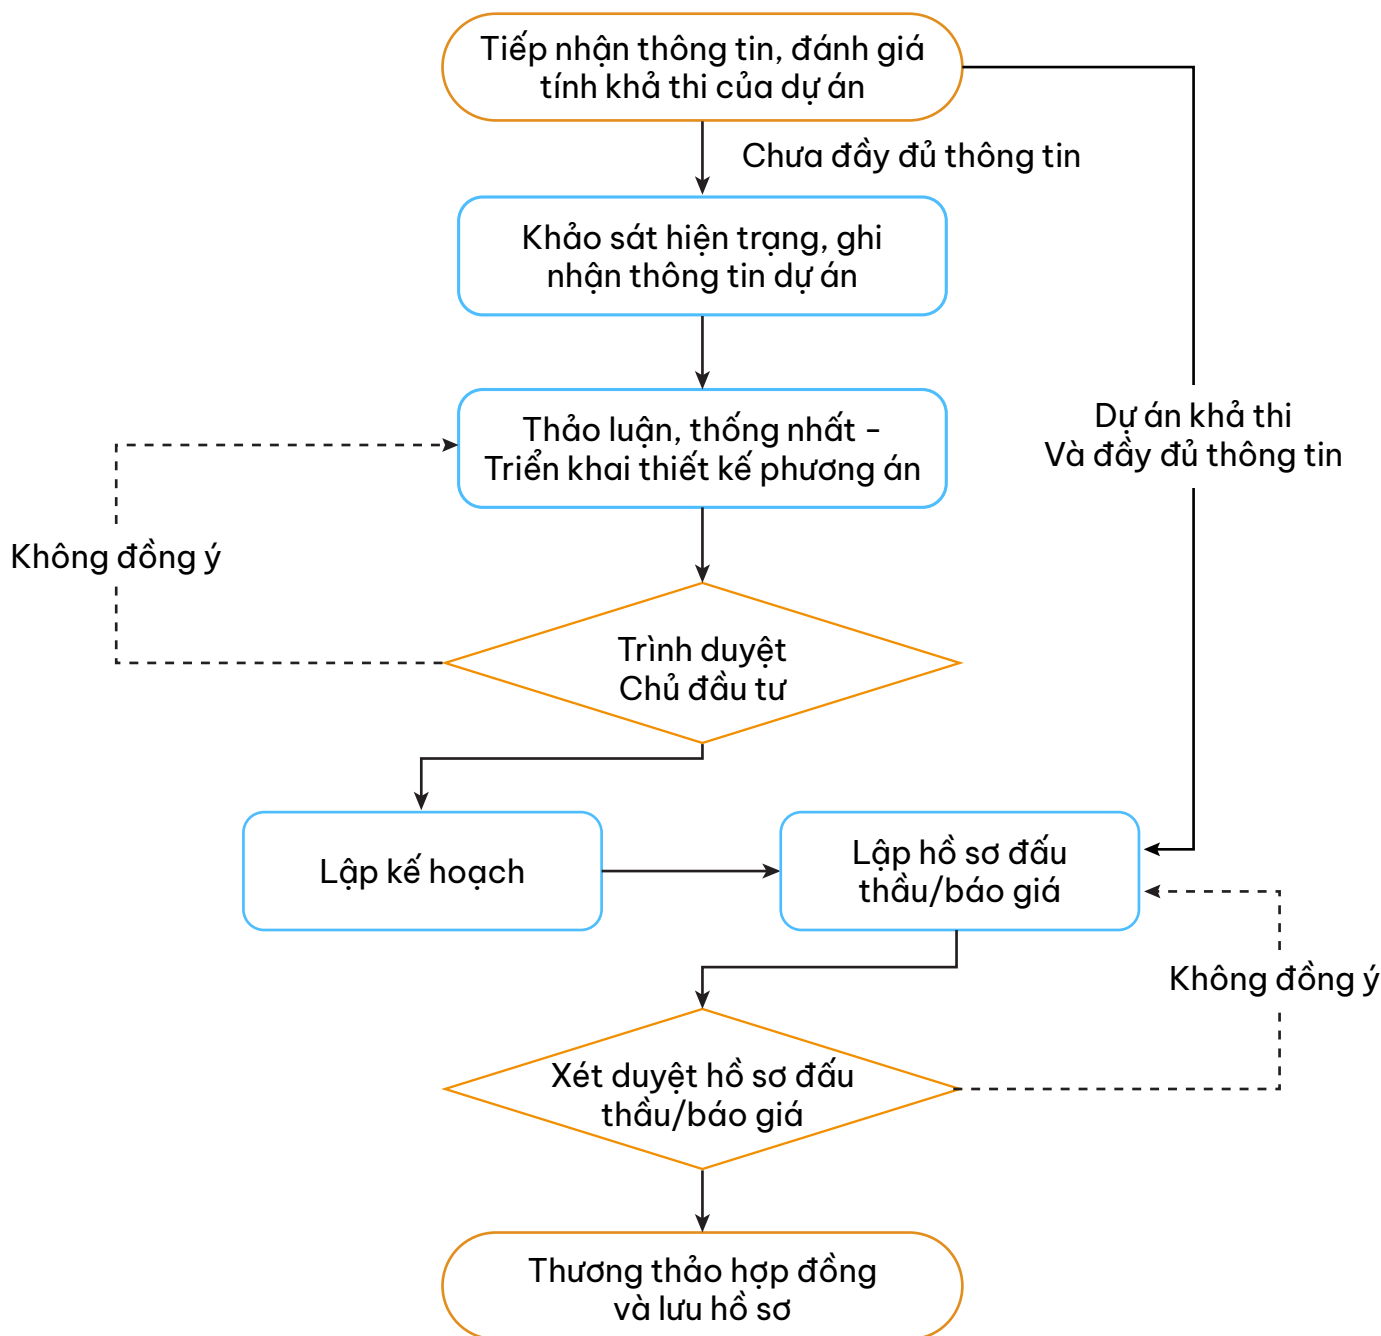

Mục đích sử dụng:

Quy trình được thiết lập để đảm bảo quá trình đánh giá dự án, triển khai thiết kế và lập hồ sơ đấu thầu diễn ra trơn tru, hiệu quả, giúp các nhà thầu tăng khả năng trúng thầu các dự án lớn khi làm việc với chủ đầu tư.

Các giai đoạn trong quy trình xem xét hợp đồng xây dựng:

- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tính khả thi của dự án
- Khảo sát hiện trạng, ghi nhận thông tin dự án
- Thảo luận, thống nhất – Triển khai thiết kế phương án
- Trình duyệt chủ đầu tư
- Lập thiết kế
- Lập hồ sơ đấu thầu/ báo giá
- Xét duyệt hồ sơ đấu thầu/ báo giá
- Thương thảo hợp đồng và Lưu hồ sơ

Bảng mô tả quy trình xem xét hợp đồng xây dựng


Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Tiếp nhận thông tin, đánh giá tính khả thi của dự án	- Đầu thầu dự án - Thiết kế kỹ thuật	Xem xét phiếu thông tin dự án/ công trình, tiến hành đánh giá tính khả thi của dự án - Nếu chưa đủ thông tin, chuyển qua bước 2 – Khảo sát hiện trạng, ghi nhận thông tin dự án - Nếu thấy dự án khả thi & đầy đủ thông tin, chuyển qua bước 6 là Lập hồ sơ đấu thầu/ báo giá
Khảo sát hiện trạng, ghi nhận thông tin dự án	- Đầu thầu dự án - Thiết kế kỹ thuật	- Tiến hành khảo sát hiện trạng, ghi nhận thông tin dự án - Lập phiếu khảo sát hiện trạng dự án
Thảo luận, thống nhất – Triển khai thiết kế phương án	Quản lý thiết kế kỹ thuật	Tiến hành thảo luận, thống nhất phương án thiết kế phù hợp với dự án để gửi chủ đầu tư - Lập bảng phân công thiết kế - Phiếu kiểm soát thiết kế - Và hướng dẫn trình tự thiết kế
Trình duyệt chủ đầu tư	Quản lý thiết kế kỹ thuật	Gửi phương án thiết kế cho chủ đầu tư: - Nếu chủ đầu tư duyệt, chuyển qua bước Lập thiết kế - Nếu không duyệt, điều chỉnh lại phương án thiết kế
Lập thiết kế	- Quản lý thiết kế kỹ thuật - Quản lý đầu thầu dự án - Phó tổng Giám đốc kỹ thuật	Thực hiện lập thiết kế dựa trên - Bảng phân công thiết kế - Phiếu kiểm soát thiết kế - Và hướng dẫn trình tự thiết kế
Lập hồ sơ đấu thầu/ báo giá	Đầu thầu dự án	Thực hiện lập hồ sơ đấu thầu và báo giá - Lập bảng dự toán báo giá - Danh mục hồ sơ báo giá

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Xét duyệt hồ sơ đấu thầu/ báo giá	• Quản lý đấu thầu dự án • Phó tổng Giám đốc kỹ thuật	Xem xét bảng dự toán báo giá, tiến hành xét duyệt hồ sơ đấu thầu/ báo giá • Nếu duyệt hồ sơ đấu thầu/ báo giá, chuyển qua bước thương thảo hợp đồng • Nếu không đồng ý, yêu cầu điều chỉnh lại hồ sơ đấu thầu/ báo giá
Thương thảo hợp đồng và lưu hồ sơ	• Quản lý đấu thầu dự án • Quản lý đấu thầu dự án	Các bên tiến hành thương thảo hợp đồng xây dựng và lưu hồ sơ khi hoàn tất • Xem xét bảng dự toán báo giá • Lập bảng theo dõi phản hồi báo giá • Lập hợp đồng



Quy trình 6: Quy trình thuê thầu phụ

Sơ đồ quy trình thuê thầu phụ ngành xây dựng

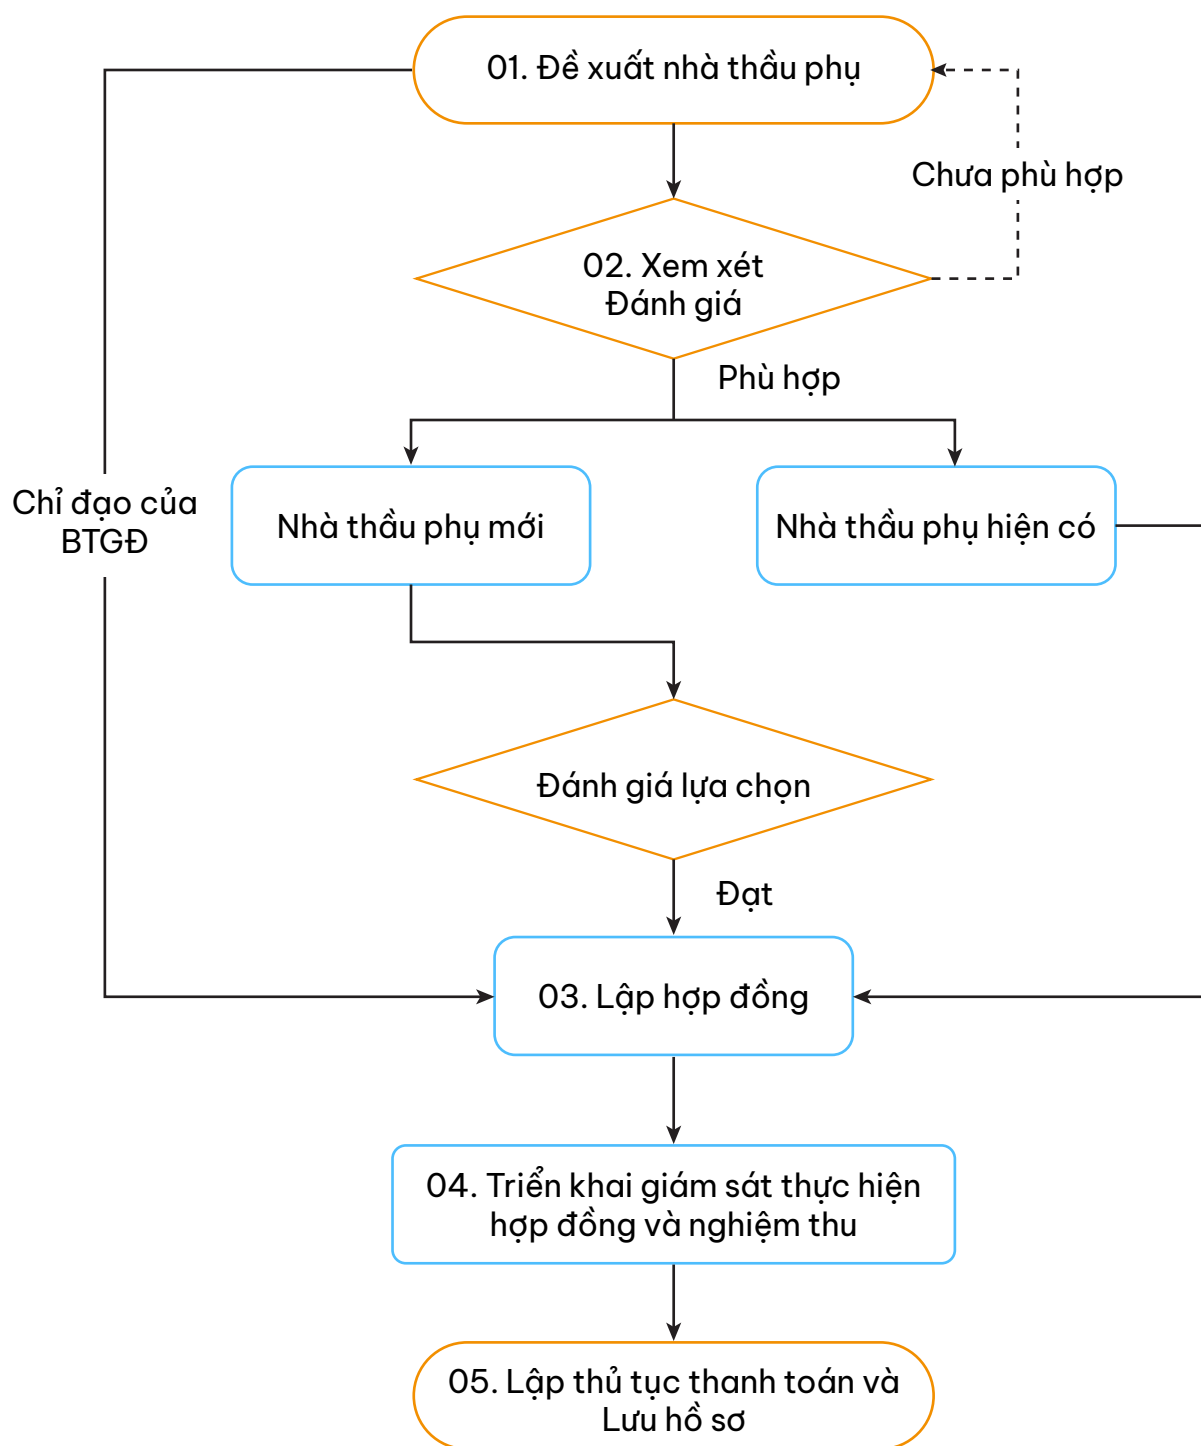

Mục đích sử dụng:

Quy trình thuê thầu phụ được thiết lập nhằm thống nhất các bước lựa chọn nhà thầu phụ theo đúng yêu cầu, tăng khả năng chọn được thầu phụ phù hợp, đảm bảo chất lượng hỗ trợ nhà thầu chính/ chủ đầu tư triển khai dự án thi công xây dựng hiệu quả, đúng tiến độ.

Các giai đoạn trong quy trình thuê thầu phụ bao gồm:


1. Đề xuất nhà thầu phụ
2. Xem xét/ đánh giá các nhà thầu phụ (lựa chọn giữa nhà thầu phụ mới và nhà thầu phụ hiện có)
3. Lập hợp đồng thầu phụ
4. Triển khai giám sát thực hiện hợp đồng và nghiệm thu
5. Lập thủ tục thanh toán và Lưu hồ sơ thầu phụ

Bảng mô tả Quy trình thuê thầu phụ ngành xây dựng

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Đề xuất nhà thầu phụ	- Ban chỉ huy - Quản lý đầu thầu dự án	Đề xuất các nhà thầu phụ dựa trên: - Bảng dự trù nhà thầu phụ - Danh mục nhà thầu phụ - Phiếu đánh giá nhà thầu phụ
Xem xét đánh giá	- Ban chỉ huy - Quản lý đầu thầu dự án - Phó tổng Giám đốc kỹ thuật	Các bộ phận chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá năng lực các nhà thầu phụ. Nếu không chọn được thầu phụ phù hợp, phản hồi lại cho bộ phận đề xuất Nếu đã chọn được nhà thầu phụ phù hợp thì: - Chuyển sang bước lập hợp đồng đối với các nhà thầu phụ hiện có - Đánh giá lựa chọn lại các nhà thầu phụ mới. Nếu đạt, tiến hành lập hợp đồng.
Lập hợp đồng	- Ban chỉ huy - Ban trợ lý - Phó tổng Giám đốc kỹ thuật	- Lập hợp đồng với các nhà thầu phụ được chọn - Lập quy trình kiểm soát thi công
Triển khai giám sát thực hiện hợp đồng và nghiệm thu	Ban chỉ huy	- Theo dõi, giám sát việc thực hiện thi công của nhà thầu phụ theo hợp đồng đã ký - Nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành của thầu phụ
Lập thủ tục thanh toán và Lưu hồ sơ	- Ban chỉ huy - Phòng kỹ thuật - thi công	- Tiến hành làm thủ tục thanh toán theo hợp đồng - Chuyển hồ sơ nhà thầu phụ sang bộ phận lưu trữ sau khi hoàn tất thanh toán và kết thúc hợp đồng

Quy trình 7: Quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ

Sơ đồ quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ

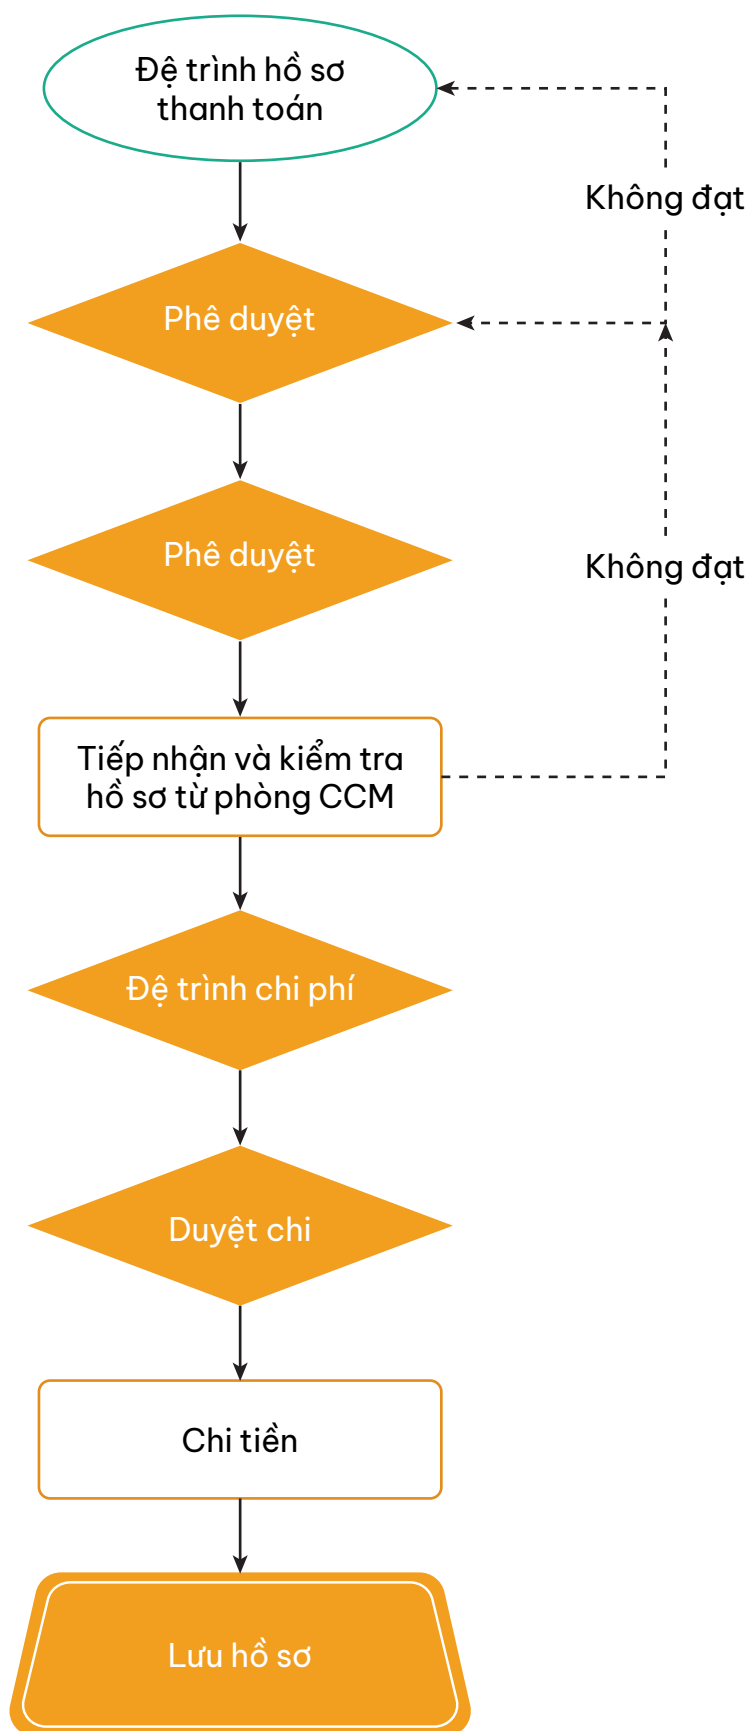

Mục đích sử dụng:

Quy trình này được áp dụng tại hầu hết các doanh nghiệp Xây dựng, để đảm bảo việc kiểm soát, phê duyệt và thanh toán khối lượng cho Nhà thầu phụ được chính xác, chặt chẽ và đúng thời hạn. Đồng thời giúp quá trình thi công diễn ra thuận lợi theo đúng tiến độ đề ra.

Các giai đoạn trong quy trình thanh toán khối lượng


Quy trình thanh toán khối lượng bao gồm 3 giai đoạn chính: Đề trình hồ sơ thanh toán, Phê duyệt & Tiếp nhận - kiểm tra hồ sơ từ phòng Chi phí & Hợp đồng (CCM)

1. Ở bước đề trình hồ sơ thanh toán, phòng chi phí & hợp đồng (P.CCM) cần chuẩn bị hồ sơ thanh toán đầy đủ theo danh mục hợp đồng, sau đó đề trình phê duyệt.
2. Ở bước phê duyệt, đòi hỏi bộ phận Kiểm soát khối lượng kiểm tra đúng theo biên bản nghiệm thu, nếu hồ sơ bị sai sót trả lại cho Nhà thầu phụ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển tiếp cho Chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án phê duyệt.
3. Ở bước Tiếp nhận & kiểm tra hồ sơ từ phòng CCM, nếu hồ sơ không đạt trả lại về phòng Kiểm soát khối lượng. Nếu đạt cần thực hiện các bước: Đề trình chi phí -> Duyệt chi -> Chi tiền -> Lưu hồ sơ.

Bảng mô tả quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Đề trình hồ sơ thanh toán	Phòng chi phí & hợp đồng	HSTT phải đầy đủ theo danh mục yêu cầu và ĐKHD, nếu thiếu thì trả về cho NTP và không ký nhận.
Phê duyệt	- Ban chỉ huy công trình - Ban Tổng giám đốc - Phòng Tài chính Kế toán	- KSKL kiểm tra đúng theo BBNT, thực tế hiện trường, điều khoản HĐ và xác nhận trong thời gian quy định và trình đến CHT hoặc GĐDA. - Nếu phát hiện hồ sơ bị sai sót thì thông báo đến Email CHT của NTP bằng biên bản kiểm tra.
Phê duyệt	- Ban chỉ huy công trình - Phòng Tài chính Kế toán	- CHT hoặc GĐDA kiểm tra đúng theo BBNT, thực tế hiện trường, điều khoản HĐ và phê duyệt HSTT trong thời gian quy định. - Thư ký hoặc KSKL thông báo bằng Email đến CHT của NTP để nhận HSTT.

Giai đoạn	Người thực hiện	Công việc cần làm
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ phòng CCM	Phòng Chi phí & Hợp đồng	- Phòng CPHĐ nhận HSTT từ NTP bằng BBGN. Kiểm tra đúng theo BBNT, thực tế hiện trường, Điều khoản HĐ trong thời gian quy định. - Nếu phát hiện hồ sơ bị sai sót thì thông báo đến Email NTP và BCHCT bằng biên bản kiểm tra.
Đệ trình chi phí	Phòng Tài chính Kế toán	- Phòng TCKT tiếp nhận HSTT từ P.CCM bằng BBGN. Kiểm tra và phê duyệt chi đúng với các điều khoản HĐ trong thời gian quy định. - Nếu HSTT sai thì trả cho P.CCM bằng BB kiểm tra qua hình thức mail.
Duyệt chi	- Ban Tổng giám đốc - Phòng Hành chính nhân sự	- Ban TGĐ nhận đề nghị thanh toán từ Phòng TCKT. Kiểm tra và phê duyệt chi trong thời gian quy định. - Nếu HSTT không đúng Ban TGĐ sẽ chuyển cho P.HCNS phối hợp xử lý bằng biên bản.
Chi tiền	Phòng Tài chính Kế toán	Bộ phận Ngân Quỹ thuộc phòng TCKT nhận được đề nghị thanh toán đã được phê duyệt từ Ban TGĐ sẽ tiến hành thủ tục chi tiền trong thời gian quy định.
Lưu hồ sơ	Phòng Tài chính Kế toán	Phòng TCKT tổng hợp lưu HSTT theo đúng quy định và tiêu chuẩn ISO.

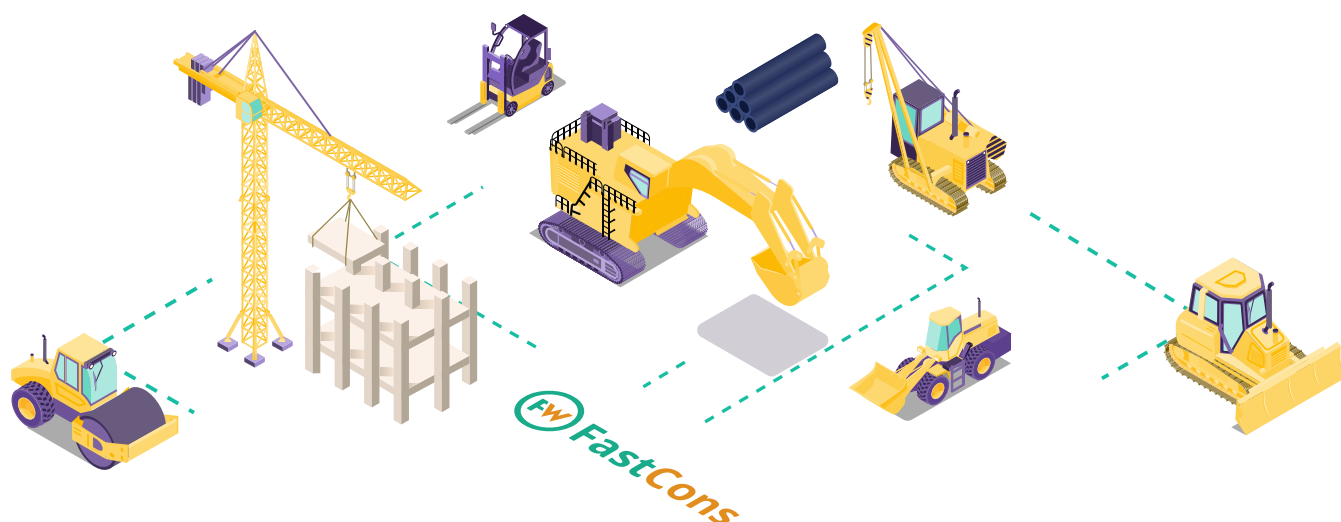




Phần 2: HƯỚNG DẪN SỐ HÓA QUY TRÌNH XÂY DỰNG


trên phần mềm FastCons

Số hóa dự án, lập kế hoạch thi công

Ứng dụng FastCons hỗ trợ thiết lập kế hoạch thi công online, phân rã công việc theo mô hình WBS với sơ đồ Gantt. Phân bổ nguồn lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu về thời gian, chất lượng & ngân sách theo kế hoạch đặt ra.

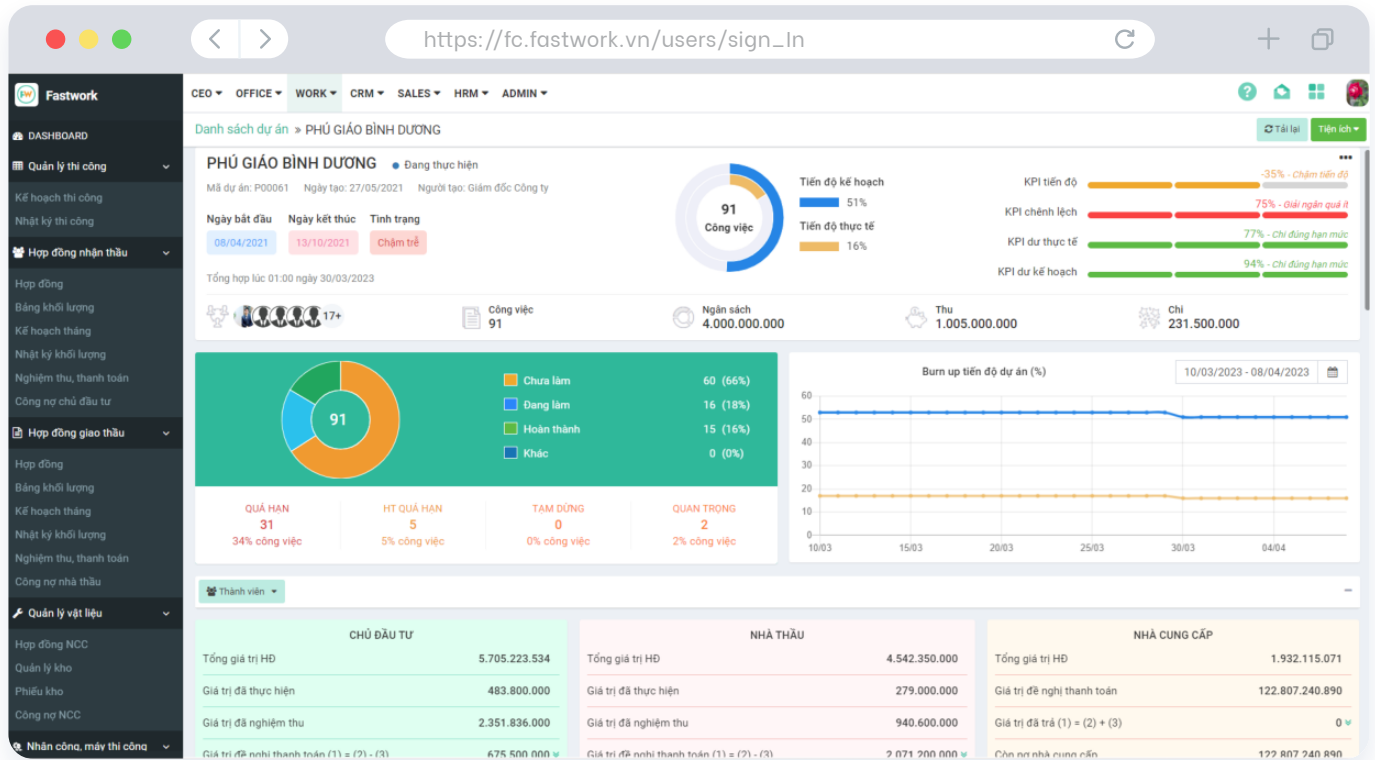

Dashboard quản lý thi công dự án chuyên sâu FastCons

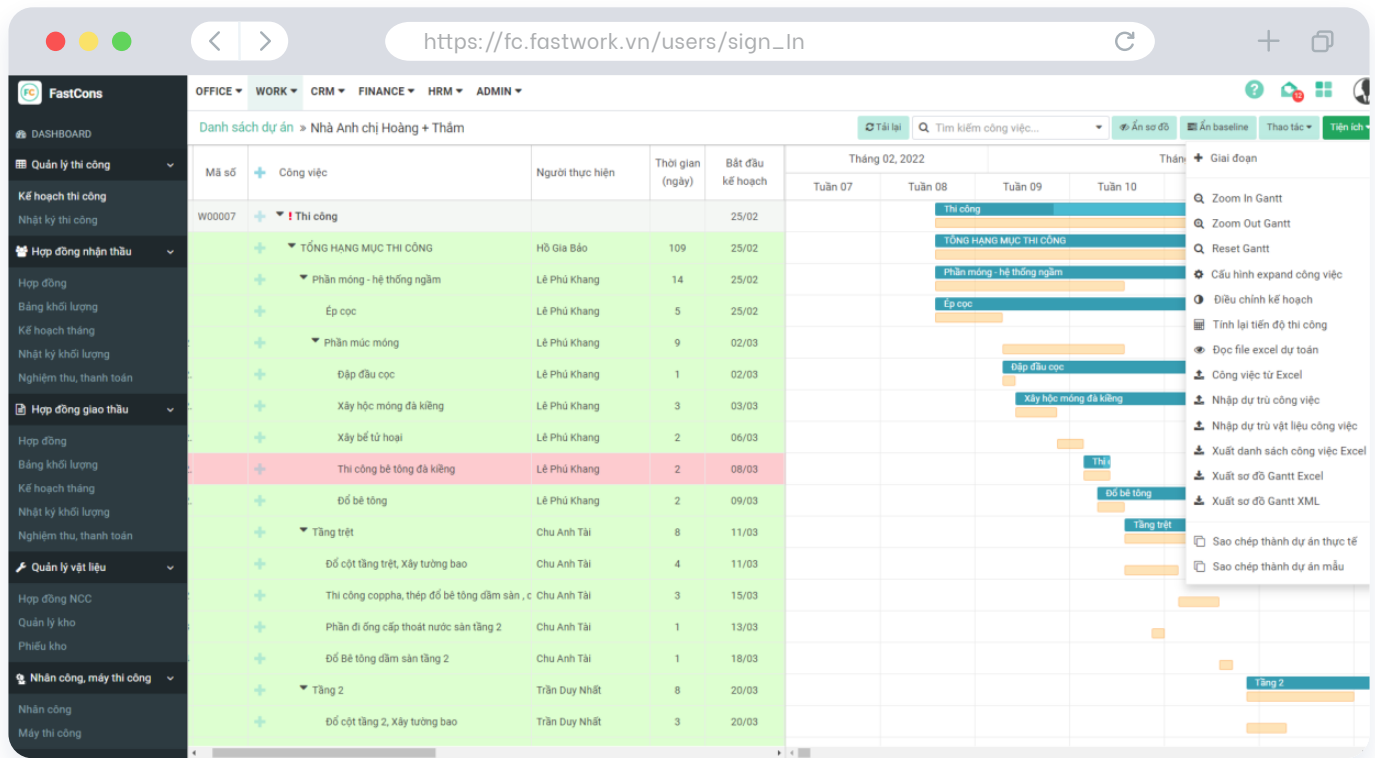

Kế hoạch thi công dự án sau khi được import lên phần mềm FastCons

Khai báo chi tiết các hạng mục thi công, công việc con, nhập liệu BoQ

Số hóa quy trình báo cáo thi công ở công trường

Hệ thống báo cáo đa dạng tất cả các vấn đề trong thi công dự án trên FastCons giúp các nhà quản lý nhanh chóng ra quyết định dựa trên dữ liệu tổng hợp hàng ngày!

Bảng theo dõi khối lượng dự án

Fastwork

CEO OFFICE WORK CRM SALES HRM ADMIN

Danh sách dự án » PHÚ GIÁC BÌNH DƯƠNG

Tải lại Tìm kiếm phiếu...

+Lập phiếu thu +Lập phiếu chi Tiện ích

NGÂN SÁCH 4.000.000.000	TỔNG THU 1.005.000.000	TỔNG CHI 231.500.000	NỢ - CHÉNH LỆCH: DỰ THỰC TẾ: DỰ KẾ HOẠCH:	2.995.000.000 773.500.000 3.768.500.000
----------------------------	---------------------------	-------------------------	---	---

Mã phiếu	Loại phiếu	Diễn giải	Giá trị	Trạng thái	Người xét duyệt	Ngày lập phiếu	Hợp đồng
CTM/0207/2023	Phiếu chi	thanh toán chi phí vật tư	10.000.000	Đã duyệt	Lê Xuân Kiên	01/02/2023	
TTM0210/2022	Phiếu thu		1.000.000.000	Đã duyệt	Lê Xuân Kiên	24/11/2022	
CTM/0197/2022	Phiếu chi		200.000.000	Đã duyệt	Lê Xuân Kiên	28/09/2022	
CTM/0182/2022	Phiếu chi		21.000.000	Đã duyệt	Lê Xuân Kiên	07/07/2022	
TTM0186/2022	Phiếu thu		5.000.000	Đã duyệt	Lê Xuân Kiên	29/06/2022	
252	Phiếu chi		500.000	Đã duyệt	Giám đốc	16/06/2022	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1 Hiện thị 1 - 6 trên tổng số 6 bản ghi

Báo cáo thu/chi dự án

Fastwork

CEO OFFICE WORK CRM SALES HRM ADMIN

Danh sách dự án » PHÚ GIÁC BÌNH DƯƠNG

Tải lại Thao tác Tiện ích

STT	Mã số	Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá	Khối lượng theo hợp đồng	Thành tiền theo hợp đồng	Khối lượng theo NKKL	Thành tiền theo NKKL
		TỔNG CỘNG				5.720.223.534		483.800.000
1		▼ PHẦN THẠCH CAO				90.000.000		403.800.000
1.1		▼ PHẦN SƠN NƯỚC				80.000.000		168.800.000
1.2		GCLD cốt thép đá kiềng	1 cấu kiện	800.000	100	30.000.000	211	37.000.000
1.3		Bả matic vào tường, trụ, vách thạch cao	1 cấu kiện	200.000	5	1.000.000	10	2.000.000
1.4		PHẦN ĐIỆN, NƯỚC	1 cấu kiện	200.000	2	400.000	0	0
1.5		Đi điện âm trần, lắp đèn	1 cấu kiện	800.000	500	400.000.000	0	0
1.6		Đi điện âm tường, đi ống nước	1 cấu kiện	700.000	50	35.000.000	30	21.000.000
1.7		PHẦN CỬA	1 cấu kiện	200.000	0	0	0	0
1.8		▼ PHẦN SẮT				1.156.600.000		40.000.000
1.8.1		▼ PHẦN HỒ				1.100.000.000		430.200.000
1.8.1.1		▼ Đào hố móng, chỉnh sửa hố móng	1 cấu kiện	500.000	100	50.000.000	370	185.000.000
1.8.1.1.1		Bê tông cốt móng	1 cấu kiện	600.000	50	30.000.000	45	27.000.000
1.8.1.2		Đổ bê tông đá kiềng	1 cấu kiện	200.000	0	0	0	0
1.8.1.3		▼ GCLD ván khuôn đá kiềng				0		200.000
1.8.1.3.1		tesst		0	0	0	0	0
1.8.1.4		San lấp mặt bằng	1 cấu kiện	700.000	300	210.000.000	200	140.000.000

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Báo cáo sản lượng giao thầu

Số hóa quy trình đề xuất - duyệt mua vật tư

Sử dụng FastCons để số hóa các biểu mẫu giấy & duyệt online:

- Lập phiếu đề nghị mua hàng (danh sách hàng hóa, số lượng, NCC) và Hợp đồng NCC theo mẫu có sẵn > Gửi duyệt > Tiến hành đặt hàng
- Theo dõi tiến độ giao hàng thực tế so với kế hoạch mua hàng

FastCons hỗ trợ Ban quản lý, Cán bộ vật tư/kế toán công trường kiểm soát đề xuất vật tư nhanh chóng - chính xác & real-time chỉ trên 1 App. Bạn có thể cập nhật & theo dõi vật tư thi công mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.

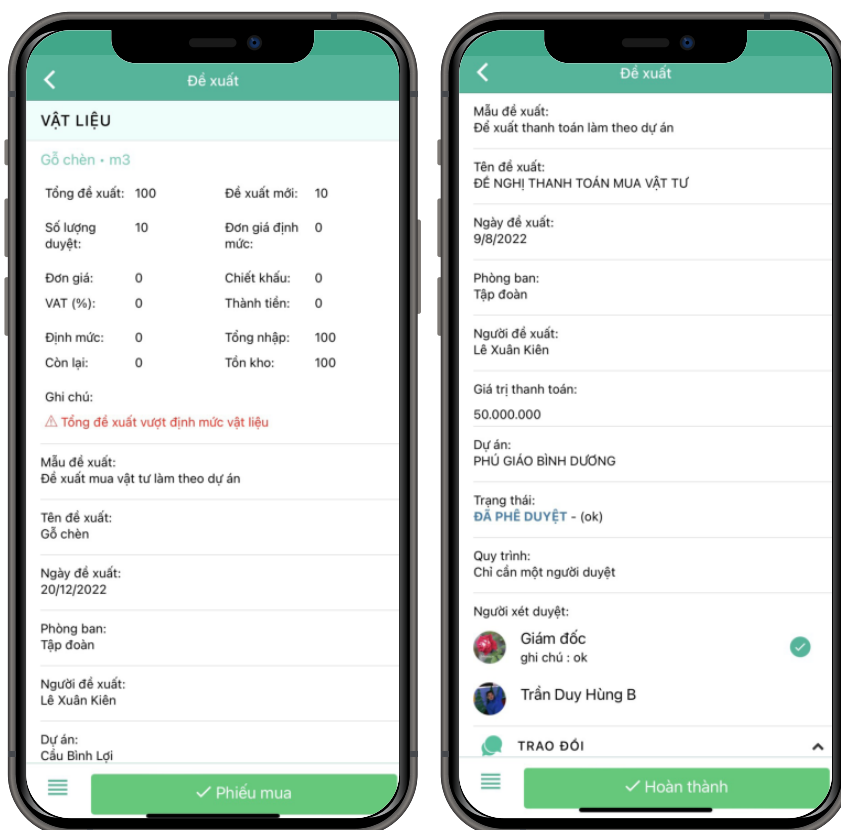

Mẫu đề xuất mua/ đề nghị thanh toán vật tư trực tuyến trên app di động

Fastwork

DASHBOARD

Quản lý thi công

Kế hoạch thi công

Nhật ký thi công

Hợp đồng nhận thầu

Hợp đồng

Bảng khối lượng

Kế hoạch tháng

Nhật ký khối lượng

Nghiệm thu, thanh toán

Công nợ chủ đầu tư

Hợp đồng giao thầu

Hợp đồng

Bảng khối lượng

Kế hoạch tháng

Nhật ký khối lượng

Nghiệm thu, thanh toán

Công nợ nhà thầu

Quản lý vật liệu

Hợp đồng NCC

CEO

OFFICE

WORK

CRM

SALES

HRM

ADMIN

?

Kho vật liệu

Định mức vật liệu

So sánh định mức

Tìm kiếm vật liệu

Q

TỔNG TIỀN

25.000.000

Lưu định mức

Nhập từ Excel

STT	Mã vật liệu	Vật liệu	Đơn vị	KL bóc tách	KL hao hụt	KL định mức	Đơn giá	Thành tiền	Cảnh báo 1 (%)	Cảnh báo 2 (%)	
1	VL/0023	Cát bê tông loại 1	m3	150.000	0	150.000	0	0	70	90	
2	A24.0807	Cột chống thép ống	kg	50	0	50	0	0	80	90	
3	A24.0262	Cột chống thép ống	kg	50	0	50	50.000	2.500.000	80	90	
4	A24.0831	Gạch ceramic 30x60 cm	m2	1.000	0	1.000	0	0	80	90	
5	A24.1204	SXLD Bulông neo M22x800	Cái	50	0	50	0	0	70	90	
6	A24.0869	Sơn lót trong nhà	kg	100	0	100	0	0	50	110	
7	Thép D8	Sắt phi D = 8	kg	1.500	0	1.500	15.000	22.500.000	80	90	
8	A24.1279	Tủ điện điều khiển bơm	bộ	100	0	100	0	0	80	90	
9	A24.1280	Tủ điện điều khiển thang nâng	bộ	100	0	100	0	0	75	90	
10	01	Vật liệu 1	Cái	100	0	100	0	0	80	110	
11	02	Vật liệu 2	Cái	250	0	250	0	0	80	90	

Tự động cảnh báo khi khối lượng đề xuất vật tư vượt quá định mức kế hoạch

Số hóa quy trình cung ứng, xuất nhập vật tư

Bạn có thể dễ dàng thiết lập & xử lý trực tuyến toàn bộ quy trình mua sắm, cung ứng, nhập xuất vật tư cho tổ đội thi công & thầu phụ trên FastCons. Phần mềm hỗ trợ theo dõi khối lượng vật tư nhập - xuất - chuyển kho & quản lý tồn kho công trình. Đồng thời quản lý chi tiết các số liệu kho, điều chuyển giữa các kho thông qua các loại phiếu nhập kho - xuất kho - chuyển kho.

Mã phiếu mua	Đơn mua	Nhà cung cấp	Ngày giao	Số hợp đồng	Giá trị phiếu mua	Thanh toán	Tiến độ nhập
MVL/0054/2023		Ngô Chương	22/02/2023		80.000.000	0	0%
MVL/0052/2022		Công ty MTV Nước Sạch Hà Nam	25/11/2022		300.000	0	100%
MVL/0038/2022	PM00132	DNTN - VLXD TÙNG LINH	03/10/2022		10.000.000	10.000.000	100%
MVL/0036/2022		anh Tuấn	19/08/2022		7.500.000	0	60%
MVL/0031/2022		Đặng Thủy Lam	01/08/2022		88.000	0	100%
MVL/0030/2022		Cải tạo sửa chữa nhà Anh Trung - Thiên Lộc - Hậu Giang	27/07/2022		12.000.000	0	83%
MVL/0029/2022		Đặng Thủy Lam	27/07/2022		24.000.000	0	0%
MVL/0022/2022		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC BÍCH	09/07/2022		1.500.000	0	100%
MVL/0020/2022	PM00124	Cty TNHH Công Nghệ Thép Vipascons	07/07/2022		150.000.000	0	0%

Quản lý chi tiết các phiếu mua - nhập - xuất - hoàn vật tư

<

>

https://fc.fastwork.vn/users/sign_in

Fastwork

Tiến độ công việc

Theo dõi bảng khối lượng

Bảng phân giao khối lượng

Sản lượng giao thầu

Tồn kho toàn dự án

Vật liệu sử dụng trong công việc hằng ngày

Vật liệu sử dụng trong công việc

Vật liệu sử dụng trong dự án

Theo dõi tiến độ mua vật liệu

Chi tiết mua từng vật liệu

Theo dõi nhập từng loại vật liệu

Nhập/xuất/hoàn vật liệu

Chi tiết nhập/xuất/hoàn vật liệu

Bảng theo dõi vật liệu

Quyết toán vật tư

Vật liệu cần dùng theo dự trừ

Sử dụng nhân công

Sử dụng máy thi công

Tài liệu

Trao đổi

CEO

OFFICE

WORK

CRM

SALES

HRM

ADMIN

Danh sách dự án

PHỦ GIÁO BÌNH DƯƠNG

Tải lại

Tháng 9

Tải báo cáo

Tổng hợp

KL nhập kho

KL xuất kho

KL hoàn kho

Theo nhà thầu

STT	Mã vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị	Tồn kho tháng 08/2022	Khối lượng tháng 09/2022				Tồn kho
					Khối lượng nhập	Khối lượng xuất	Khối lượng hoàn		
1	VL/0033	Xi măng Insee	Bao	500	0	0	0	500	
2	VL/002	Gạch	viên	150	0	0	0	150	
3	A33.0062	Automat 3 pha 50A	cái	0	0	0	0	0	
4	SP771334302	Đá mi lớn	m3	100	0	0	0	100	
5	SP001468	A234567	Bộ	-82	0	0	0	-82	
6	VL_0001212	123	cm	-54	0	0	0	-54	
7		Bếp ăn	Mét dài	-2	0	0	0	-2	
8	A24.0782	Bạt lót nền	m2	-34	0	0	0	-34	
9	A24.0171	Cát	m3	-500	0	0	0	-500	
10	A24.1279	Tủ điện điều khiển bơm	bộ	-65	0	0	0	-65	
11	VL/0026	Bạt che (50x50)	40	-1	0	0	0	-1	
12		Bếp trên	Mét dài	-1	0	0	0	-1	
13	A24.0807	Cột chống thép ống	kg	-30	0	0	0	-30	
14	VL/0032	Xi măng Insee	Bao	-1	0	0	0	-1	

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Hiện thị 1 - 20 trên tổng số 27 bản ghi


Bảng theo dõi chi tiết kho vật tư

Số hóa quy trình đề xuất thanh toán chi phí & thanh toán cho thầu phụ/NCC

FastCons hỗ trợ quản lý danh sách đối tác, thầu phụ kèm theo đó là các hợp đồng giao thầu. Trong hợp đồng giao thầu bao gồm các hạng mục giao thầu, kèm khối lượng giao khoán chi tiết cho thầu phụ đã được ký kết. Tự động thành tiền dự toán theo hợp đồng. Đồng thời, FastCons còn giúp quản lý chi tiết các lần nghiệm thu tương ứng với từng nhà thầu phụ, từng kỳ thanh toán & tiến độ giải ngân.

STT	Mã số	Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá	Khối lượng theo hợp đồng	Thành tiền theo hợp đồng	Khối lượng theo NKKL	Thành tiền theo NKKL	Khối lượng nghiệm thu	Thành tiền nghiệm thu
TỔNG CỘNG						4.598.779.652		1.300.000.000		920.000
1		Mặt nước	md	0	1	0	0	0	0	0
2		▼ 123HDN/2022				3.577.200.000		1.300.000.000		920.000
2.1	AB.25122	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng m	100m3	200.000	10.000	2.000.000.000	1.500	300.000.000	1.600	320.000
2.2	AB.41432	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi < 100m	100m3	100.000	100	10.000.000	10.000	1.000.000.000	0	0
2.3	AB.65130	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ ch	100m3	250.000	200	50.000.000	0	0	0	0
2.4	AF.81111	Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng bằng, móng bê, bê má	100m2	400.000	150	60.000.000	0	0	0	0
2.5	AF.61110	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, d	tấn	420.000	200	84.000.000	0	0	0	0
2.6	AF.21112	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trư	m3	1.200.000	500	600.000.000	0	0	500	600.000
2.7	AF.21212	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trư	m3	1.000.000	100	100.000.000	0	0	0	0
2.8	CV3.01.07	Tỉng mới cây xanh vỉa hè (Cây Sao)	cây	1.200.000	50	60.000.000	0	0	0	0
2.9	AE.11224	Xây tường thẳng bằng đá học, chiều dày <= 60cm, chiều	m2	1.800.000	160	288.000.000	0	0	0	0
3		▼ PL01				1.021.579.652		0		
3.1		▼ DỰ TOÁN THI CÔNG XÂY DỰNG				440.698.077		0		
3.1.1		CÔNG TÁC THÁO DỖ	GÓI	31.283.254	1	31.283.254	0	0	0	0
3.1.2		CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CƠ BẢN	GÓI	207.113.123	1	207.113.123	0	0	0	0
3.1.3		CÔNG TÁC HOÀN THIỆN ĐIỆN, NƯỚC	GÓI	57.616.700	1	57.616.700	0	0	0	0
3.1.4		CÔNG TÁC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MÁY LẠNH	GÓI	144.685.000	1	144.685.000	0	0	0	0
3.2		▼ DỰ TOÁN THI CÔNG NỘI THẤT				555.991.575		0		
3.2.1		PHÒNG KHÁCH + BẾP	GÓI	217.311.925	1	217.311.925	0	0	0	0

Bảng khối lượng giao thầu sau khi số hóa lên phần mềm

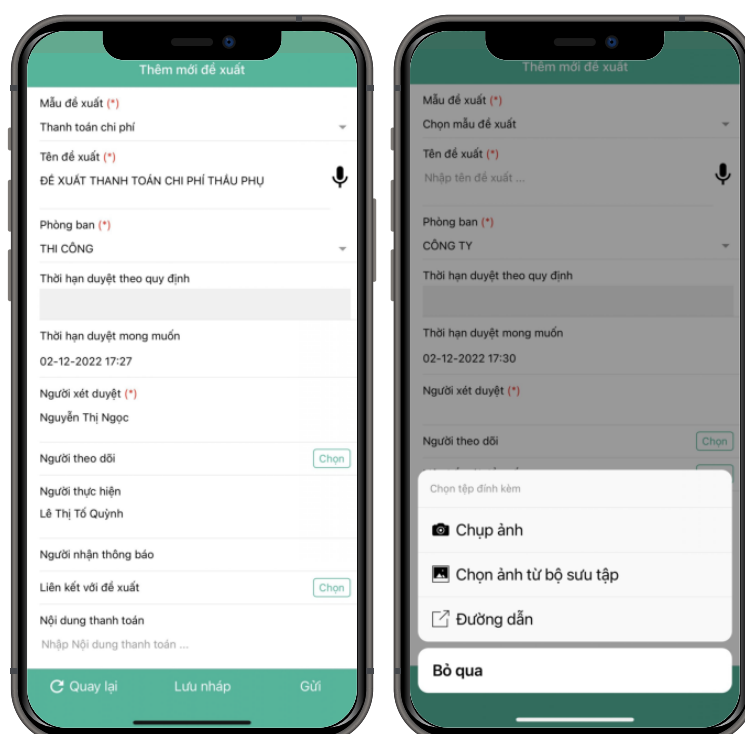

Khởi tạo đề xuất thanh toán ngay trên app di động

Phần 3:

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG FASTCONS

So với các phần mềm quản lý dự án trên thị trường, FastCons sở hữu ưu điểm vượt trội nhờ cung cấp nền tảng quản lý chuyên sâu thiết kế riêng cho doanh nghiệp Xây dựng. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa & quản lý không giới hạn dự án trên một màn hình duy nhất giúp ban lãnh đạo nắm bắt trực quan tiến độ, sức khỏe dự án để có căn cứ phân bổ & sử dụng nguồn lực phù hợp, FastCons đi sâu vào từng khía cạnh cốt lõi trong hoạt động quản lý dự án thi công xây dựng.

- **Quản lý tiến độ:** Môi trường quản lý tập trung, theo dõi, cập nhật tiến độ thi công theo ngày, báo cáo khối lượng & hạng mục thi công thực tế từ công trường theo thời gian thực
- **Quản lý vật tư:** Quản lý xuất/nhập vật tư từ công trường, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư, khối lượng thực hiện, giảm rủi ro vượt định mức, tránh lãng phí...
- **Quản lý tài chính:** Dashboard dự án xây dựng cung cấp cho người dùng 3 chiều thông tin về tài chính dự án bao gồm dòng tiền, công nợ & chi phí dự án. Giúp Nhà thầu xây dựng tự đánh giá được tình hình tài chính dự án ở hiện tại & có dự đoán trong thời gian tới.



Ngoài ra, để đảm bảo luồng thông tin xuyên suốt, FastCons cung cấp phiên bản Mobile hỗ trợ chỉ huy công trường cập nhật thông tin nhanh chóng về văn phòng: nhật ký thi công, xuất nhập vật tư, các vấn đề, chi phí phát sinh tại công trường. Báo cáo có thể cập nhật hàng ngày, hàng tuần realtime mà không cần đợi các bộ phận khác tổng hợp.

Giải pháp đang được ứng dụng mạnh mẽ ở hàng trăm nhà thầu xây dựng trên cả nước như: Tổng thầu LAIMIAN, FBV, Tập đoàn PC1, EVNPECC4, Xcons, Viglacera, VNC, 319.5,...

Được sử dụng bởi hàng nghìn nhà thầu Xây dựng lớn

Thi công xây dựng



Thiết kế thi công Nội thất



Thi công Cơ điện



DEMO PHẦN MỀM FASTCONS





PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG CHUYÊN SÂU, HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

🏠 **Trụ sở chính:** Khu văn phòng Tầng 3, Tòa CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

🏠 **Chi nhánh Miền Nam:** Tầng 6, Tòa Parami, Số 140 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ _____

✉ **Email:** Fastcons@fastwork.vn

☎ **Hotline tư vấn:** 0983-089-715

🌐 **Website:** <https://fastcons.fastwork.vn/>

